

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	公共下水道の耐震対策（復興基本方針関連（全国防災））																	
計画の期間	平成24年度	～	平成24年度	（1年間）		交付対象	富士宮市											
計画の目標	市内公共下水道を整備することにより、生活環境の改善と公共水域の水質保全、浸水対策を促進し、住みよく快適なまちづくりをめざす。																	
計画の成果目標（定量的指標）																		
星山浄化センターの耐震・改築を行うことにより、耐震補強率を0%から100%にする。																		
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値				備考							
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H 末)	最終目標値 (H27末)									
①	耐震補強率＝ 地震に対して備えておく必要がある場所（管理本館沈砂池プロア棟）に対して耐震補強が済んだ箇所						0%		100%									
②																		
③																		
全体事業費	合計 (A+B+C)	45 百万円	A	45 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0%								
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制							事後評価の実施時期											
関係課内で、事後評価の審査を平成27年12月に実施し、取りまとめた（案）を、市内部で評価して、平成28年1月に実施							同時に進め来ました通常分と共に平成27年度に実施（平成28年1月19日）											
							公表の方法											
							評価完了後、市のホームページへ掲載											
事後評価																		
1. 交付対象事業の進捗状況（○：計画期間中に完成 △：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入） -：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））																		
交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
											H22	H23	H24	H25	H26			
1-A-1	公共	一般	富士宮市	直接	富士宮市		改築	星山浄化センター 耐震補強	管理本館耐震化 35,850㎡/日	富士宮市						45	○	
											合計	45						
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26				
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考						


C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	進捗 状況	備考
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
 （参考） 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業
 （別添「事業実施計画」参照）

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		星山浄化センター（管理本館沈砂池プロワ棟）の耐震補強工事を行うことにより、公共水域の水質保全を長期的に維持できる。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（ ）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た 要因
		最終実績値	100%	
	指標②（ ）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た 要因
		最終実績値		
	指標③（ ）	最終目標値		目標値と実績値に差が出た 要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）				

(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

計画の名称	公共下水道の耐震対策 (復興基本方針関連 (防災安全))		交付対象	富士宮市
計画の期間	平成24年度 (1年間)			

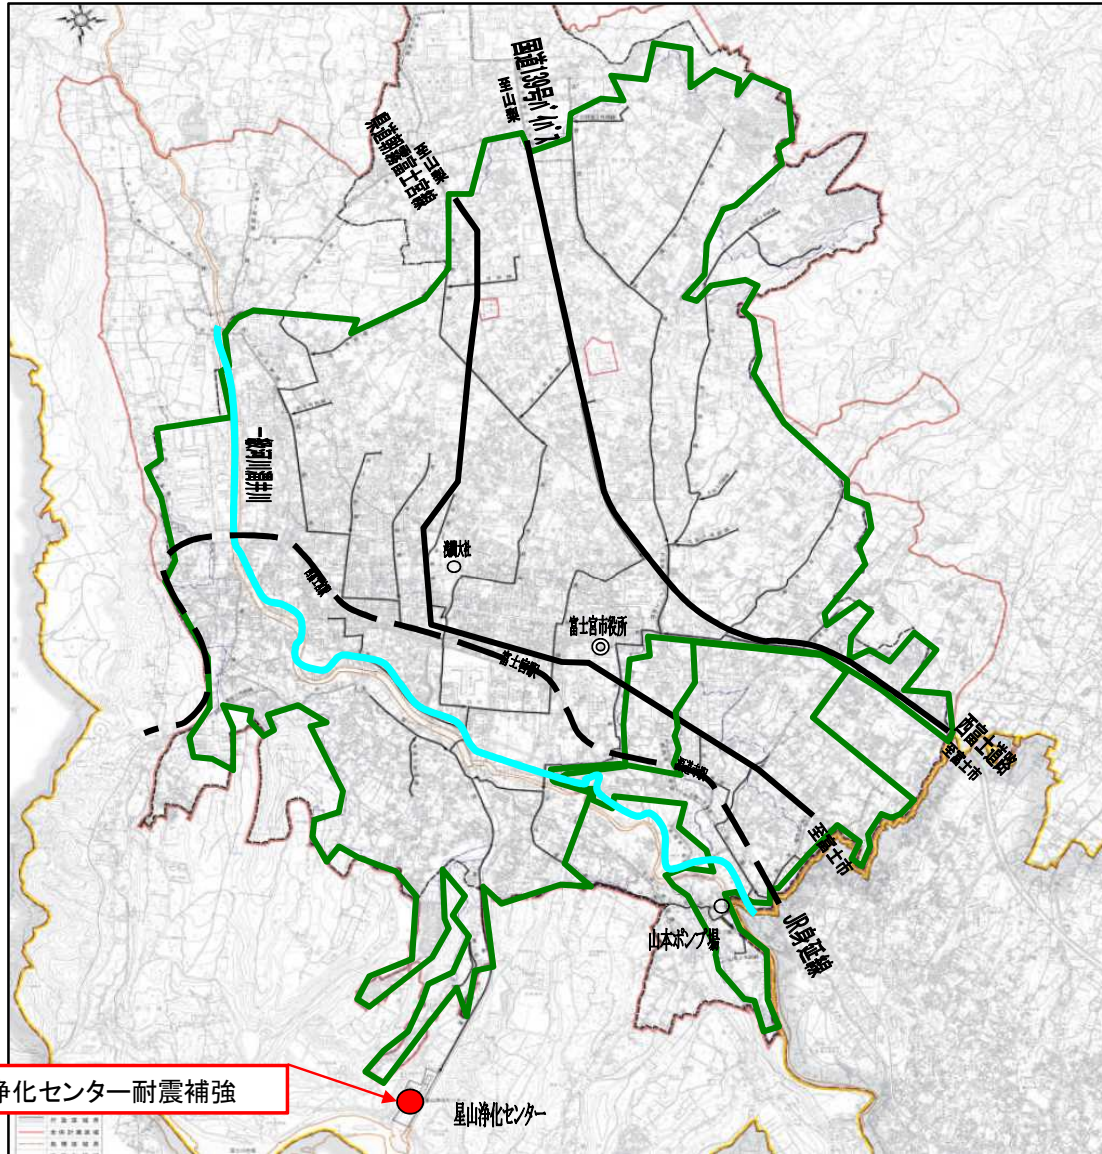

凡例	
	事業計画区域
●	A 基幹事業
	C 効果促進事業
—	河川(潤井川)

1-A-1 星山浄化センター耐震補強

星山浄化センター
